Zał. 8

Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S17 Warszawa (w.Zakręt) - Garwolin na odcinku węzeł "Lubelska" (bez węzła) - Garwolin (początek obwodnicy).
Część 2: na odcinku obwodnica Kołbieli od ok. km 19+200 do ok. km 27+900 dług. ok. 8,700 km.

Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Lublinie, 20-075 Lublin, ul.Ogrodowa 21.

ZAAWANSOWANIE FINANSOWE KONTRAKTU [PLN]
STAN NA DZIEŃ 31.05.2019 - WG WYDANYCH PŚP

Inżynier: MGGP S.A. ul. Kaczkowskiego 6, 33-100 Tarnów NIP: 734-24-80-395

Wykonawca: Lider: Strabag Sp.z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków; Partner: Strabag Infrastruktura Południe Sp.z o.o., Wysoka, ul. Lipowa 5a, 52-200 Wrocław

PLANOWANE I RZECZYWISTE WYKONANIE FINANSOWE NETTO [PLN] - KOSZTY OGÓLNE I DOKUMENTY WYKONAWCY

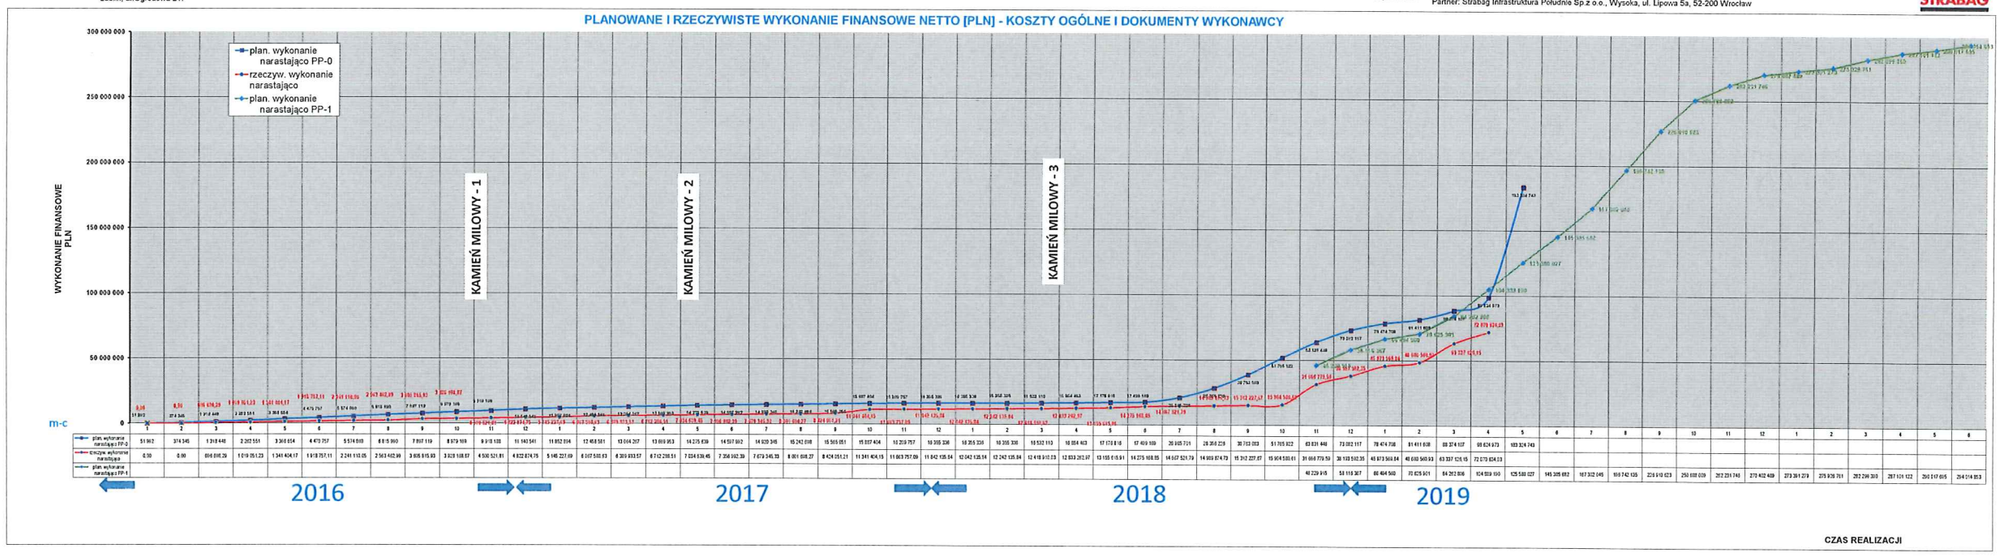

CZAS REALIZACJI

KWOTY NETTO	2016												2017												2018												2019												2020					
Wykonanie w m-cu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6
Realizacja miesięcy	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6
plan. wykonanie miesięcznie PP-0	51 902	322 353	644 123	644 123	1 124 123	1 124 123	1 124 123	1 241 133	1 691 133	1 692 053	839 020	1 222 253	712 353	676 858	835 858	676 858	835 858	322 353	322 353	322 353	322 353	322 353	322 353	149 579	9	0	170 774	322 353	322 353	322 353	3 409 832	7 370 526	10 405 857	13 052 829	12 005 525	9 252 571	5 302 541	2 935 361	8 862 898	13 256 867	84 699 773	19 835 655	21 919 303	29 440 003	30 108 459	23 777 305	11 543 737	8 173 744	2 868 790	2 535 482	8 372 618	4 851 743	2 913 573	3 907 158
plan. wykonanie narastająco PP-0	51 902	374 345	1 018 468	2 203 551	3 300 654	4 473 757	5 574 910	6 815 990	7 897 119	8 979 109	9 918 108	11 140 541	11 852 894	12 403 531	13 004 247	13 668 963	14 279 839	14 587 692	14 920 045	15 242 698	15 565 051	15 887 404	16 209 757	16 355 336	16 355 336	16 526 110	16 856 463	17 178 816	17 499 169	20 905 731	28 356 229	38 763 086	51 705 922	63 831 448	73 052 017	78 474 738	81 411 808	89 274 127	98 624 973	103 324 743														
plan. wykonanie miesięcznie PP-1																																				11 038 452	8 378 193	4 131 342	13 536 914	25 425 304	23 050 837																		
plan. wykonanie narastająco PP-1																																				40 229 915	58 118 367	69 464 542	73 025 901	84 262 826	104 859 130	125 550 327																		
rzeczyw. wykonanie miesięczne	0,00	0,00	666 645,29	322 353,04	322 353,04	577 363,04	322 353,04	322 353,04	1 042 353,04	322 353,04	572 353,04	322 353,04	322 353,04	672 352,04	322 353,04	322 353,04	321 353,04	322 353,04	322 353,04	322 353,04	322 353,04	422 353,04	2 417 352,04	322 353,04	178 278,75	206 600,00	206 600,00	170 774,15	414 353,04	322 353,04	1 119 352,04	3 612 352,04	322 353,04	322 353,04	602 352,04	15 702 168,98	4 526 812,78	7 779 877,48	2 756 961,79	14 656 565,22	8 732 557,88														
rzeczyw. wykonanie narastająco	0,00	0,00	666 645,29	1 019 051,33	1 341 404,37	1 919 767,41	2 241 110,45	2 563 463,49	3 605 816,53	3 928 169,57	4 500 521,61	4 822 874,65	5 145 227,69	5 817 580,73	6 139 933,77	6 462 286,81	6 784 639,85	7 106 992,89	7 429 345,93	7 751 698,97	8 074 052,01	8 496 405,05	10 913 757,09	11 082 035,84	11 082 035,84	11 252 635,99	11 667 489,03	11 838 089,18	12 252 442,22	12 574 795,26	13 694 148,30	17 306 500,34	17 628 853,38	18 231 205,42	33 933 374,40	38 460 187,18	46 240 064,66	48 996 026,45	63 652 591,67	72 385 149,55														
% zaawansowania kontraktu	0,00%	0,00%	0,38%	0,56%	0,73%	1,05%	1,22%	1,40%	1,97%	2,14%	2,45%	2,63%	2,81%	3,31%	3,49%	3,66%	3,84%	4,01%	4,19%	4,36%	4,60%	6,19%	6,36%	6,46%	6,57%	6,60%	6,77%	7,00%	7,16%	7,79%	8,00%	8,16%	8,35%	8,66%	10,77%	12,99%	15,44%	16,56%	21,54%	24,51%														
% wykonania harm w okresie raport.	0,00%	0,00%	73,79%	34,14%	29,20%	52,29%	29,20%	25,97%	96,41%	29,79%	60,96%	26,37%	45,25%	152,29%	53,22%	53,22%	53,22%	100,00%	100,00%	100,00%	131,02%	905,02%	100,00%	122,53%	0,00%	0,00%	100,00%	128,54%	100,00%	347,31%	11,25%	4,37%	3,10%	4,56%	130,64%	54,91%	92,80%	65,52%	107,43%	42,34%														
% wykonania harm narastająco	0,00%	0,00%	52,84%	45,04%	39,84%	42,92%	40,20%	37,61%	45,66%	43,75%	45,36%	43,29%	43,41%	48,70%	49,51%	49,10%	49,28%	50,40%	51,47%	52,50%	54,12%	71,39%	71,96%	72,41%	73,63%	74,65%	75,12%	76,14%	76,99%	81,56%	69,66%	52,66%	39,50%	30,72%	49,61%	65,72%	69,14%	68,93%	75,17%	68,71%														
											KAM-1												KAM-2												KAM-3																		
